



Baustellenreport 06

Umbau des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss
KW 19-22/2024

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss wird mit diesem Baustellenreport den Umbau des Rüsthauses Leoben-Göss dokumentieren und Informationen über das Baugeschehen und des Baufortschrittes geben.

Im Teil 06 unseres Baustellenreportes berichten wir über den Bauabschnitt 2.


Im Bauabschnitt 2 ist der Umbau des Mannschaftsraumes in einen Schulungsraum, die Schaffung bzw. Errichtung eines neuen Aufenthaltsraumes sowie einer Küche mit einem Lager und einer Kühlzelle vorgesehen.

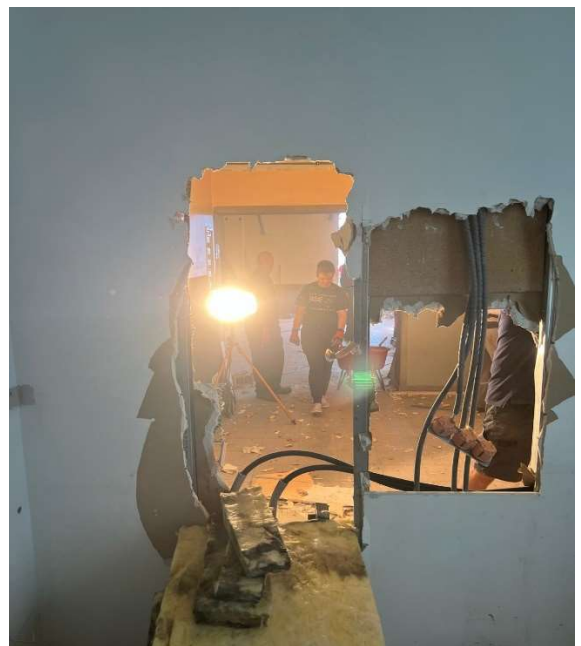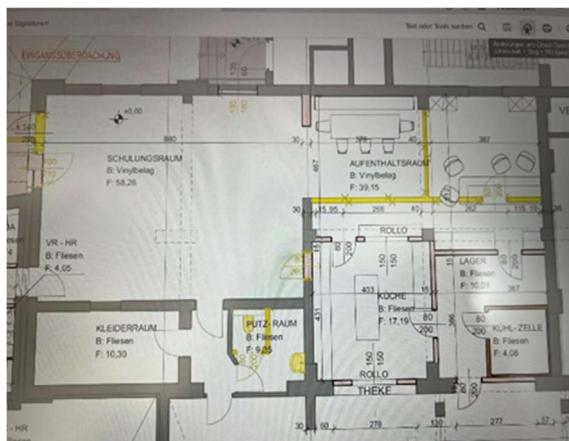



Kalenderwoche 19-22/2024:


Am 6.5.2024 war der Start des 2. Bauabschnittes. Für uns wieder einmal ein „Großkampftag“, galt es ja mit dem Entkernen der angeführten Räumlichkeiten zu beginnen.



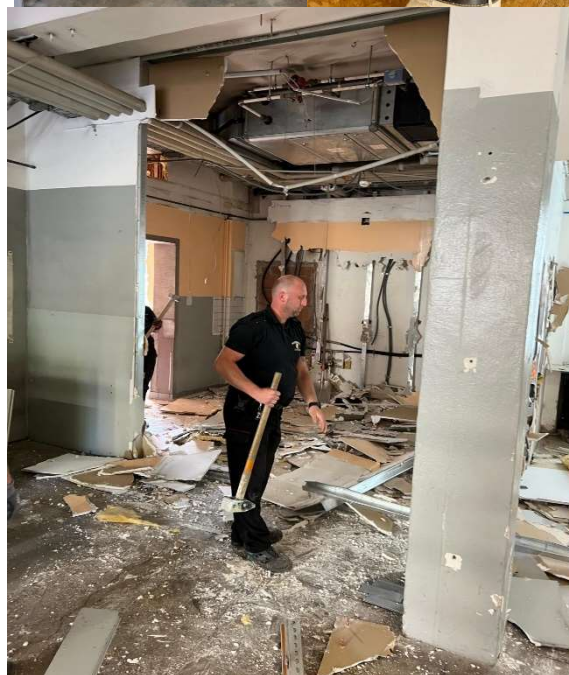


Nachdem die Räumlichkeiten entkernt waren, wurde bereits mit dem Aufstellen von neuen Wänden und den Stemmarbeiten für Leitungen und Rohre begonnen.

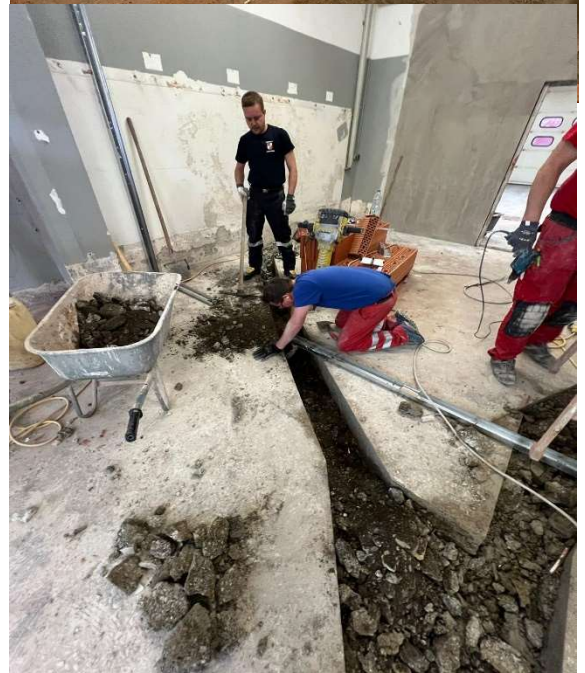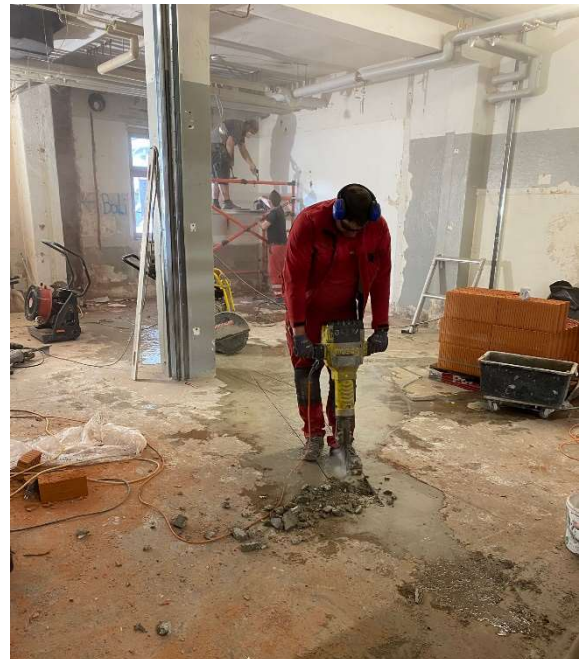

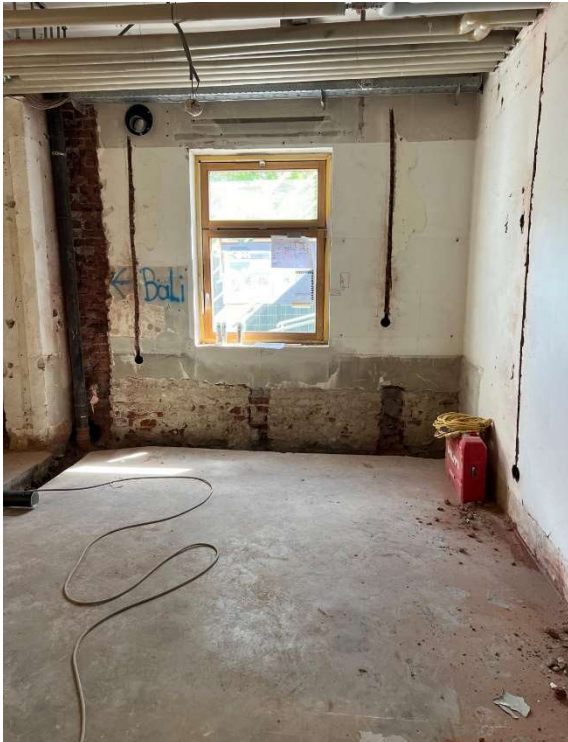

auch sehr viel Kraft! So mussten ca. zwei Wochen lang die Wände von den Farbanstrichen, durch Abschaben bzw. Abfräsen, befreit und stellenweise der alte Verputz beseitigt werden, um anschließend wieder einen soliden und stabilen Wandaufbau schaffen zu können.

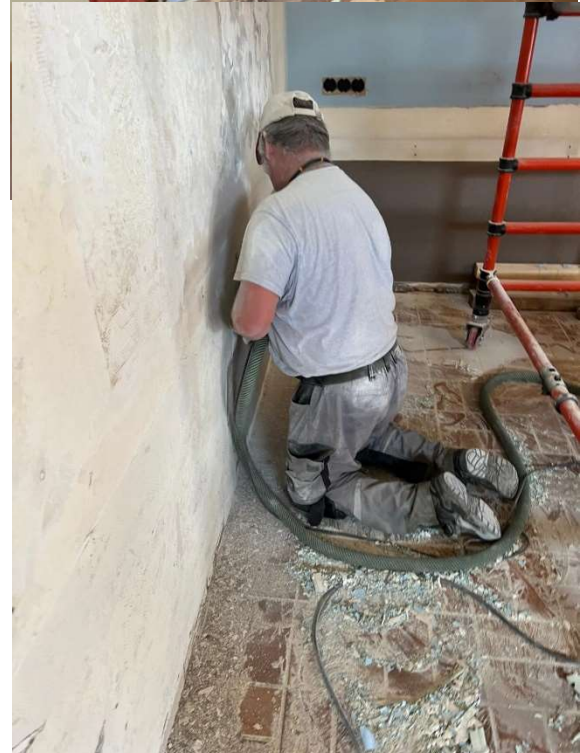

Die Arbeiten verliefen anfangs sehr gut und es ging relativ rasch voran. Doch die alten Gemäuer haben es in sich, feuchte Stellen, die beseitigt bzw. trockengelegt werden müssen und der Verputz sowie die zahlreichen Farbanstriche an den Wänden raubten uns nicht nur Zeit, sondern

In der nächsten Ausgabe berichten wir über den weiteren Verlauf unseres Bauabschnittes und wie sich die Arbeiten gestalteten.

GUT HEIL!

Thomas STEINER, BI e.h.



So das war es wieder einmal. Trotz einiger kleinerer Rückschläge und massiver körperlicher Anstrengung ist uns das Lachen noch nicht vergangen, im Gegenteil, wir kämpfen weiter!

